Harmonogram wykonania domku jednorodzinnego
Wykonawca: "BUDOMEK"
Inwestor: D.J.Kowalski

Nr	Czynności	Czas	Dat.roz.	Dat.zak.	Wart.
-	Fundamenty i piwnice	48	3. 2.03	29. 3.03	195 815,55
1.	roboty ziemne	4	3. 2.03	6. 2.03	21 143,77
2.	podłoża i fundamenty	2	11. 2.03	12. 2.03	7 923,28
3.	izolacje	3	13. 2.03	15. 2.03	5 158,03
4.	posadzki piwnic	2	17. 2.03	18. 2.03	131,82
5.	ściany zewnętrzne piwnic	7	17. 2.03	24. 2.03	41 466,57
6.	izolacje pionowe piwnic	4	25. 2.03	28. 2.03	3 240,07
7.	ściany wewnętrzne piwnic	23	17. 2.03	14. 3.03	100 669,89
8.	schody wewnętrzne	5	25. 3.03	29. 3.03	3 501,36
9.	strop piwnic	2	15. 3.03	17. 3.03	4 409,71
10.	ocieplenie stropu piwnic	9	18. 3.03	27. 3.03	8 171,05
-	Pierwsza kondygnacja	11	18. 3.03	29. 3.03	36 330,35
11.	ściany pierwszej kondygnacji	3	18. 3.03	20. 3.03	10 757,94
12.	schody zewnętrzne	2	18. 3.03	19. 3.03	2 073,41
13.	posadzka łazienki - I kondygnacja	5	18. 3.03	22. 3.03	7 535,20
14.	strop pierwszej kondygnacji	8	21. 3.03	29. 3.03	15 963,80
-	Dach i poddasze	44	21. 3.03	13. 5.03	77 634,71
15.	ściany poddasza	19	31. 3.03	21. 4.03	35 731,79
16.	posadzka łazienki - poddasze	8	31. 3.03	8. 4.03	4 618,52
17.	konstrukcja dachu	9	22. 4.03	2. 5.03	12 681,02
18.	krycie dachu dachówką	8	5. 5.03	13. 5.03	9 037,16
19.	obróbki blacharskie	5	5. 5.03	9. 5.03	2 379,93
20.	licowanie ścian płytkami ceram.	9	21. 3.03	31. 3.03	4 610,49
21.	tynkowanie i wykończenie zewn.	11	22. 4.03	6. 5.03	8 575,80
-	Prace wykończeniowe	26	22. 4.03	23. 5.03	21 789,76
22.	wykończenie poddasza	9	14. 5.03	23. 5.03	14 912,16
23.	montaż stolarki okiennej	4	14. 5.03	17. 5.03	4 477,70
24.	montaż stolarki drzwiowej	1	7. 5.03	7. 5.03	170,88
25.	drobne prace wykończeniowe	3	22. 4.03	24. 4.03	2 229,02

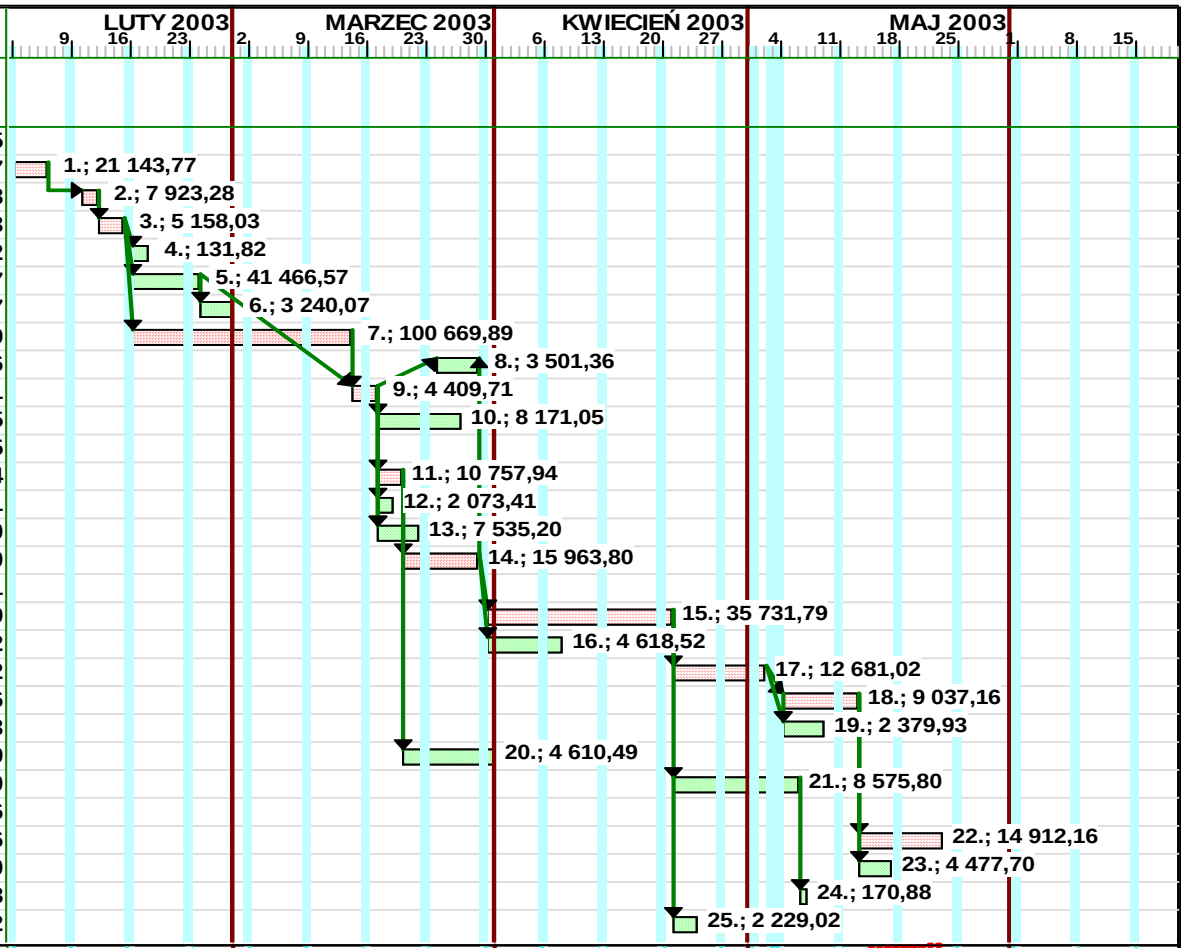

WARTOŚCI 8.Wart.Całk. 331 968,37 zł				
Zestawienia miesięczne:	127 260,01	112 066,32	57 890,36	34 751,68

Data: 2008-01-28		Wykonał: Jan kowalski	Zatwierdził:
